



Status for projektet uddannelseslæge.dk (Nyt logbog.net og evaluer.dk)

Marts 2022

Dato	Sagsbehandler	e-mail	Sagsnr.
19-04-2022	Bertil Selde Krogh	berkro@rm.dk	1-30-72-368-21

Projektledelsen har sammen med leverandøren gennemført en grundig analyse af projektet, og det har vist sig, at der er i den nuværende projektramme, vil være **udfordringer** med at få løst samtlige opgaver og udviklet de features, som efter projektledelsens opfattelse skal være med i en minimumsudgave af det nye system. Styregruppen for projektet har tilkendegivet, at det er afgørende, at det nye system skal være klart til den planlagte tid og med en tilfredsstillende kvalitet. Styregruppen har godkendt, at der arbejdes videre med at gennemføre projektet, samtidig med at der er iværksat en proces med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre projektet.

I projektet er **der nu fokus på:**

- sikring af projektets økonomi og fremdrift
- test og tilretning af udviklede funktioner
- test og tilretning i forhold til arbejdsgange
- afslutning af områder som design og visuelt udtryk for systemet herunder offentlige tilgængelige evalueringer
- planlægning af den resterende udviklingsperiode, centrale testperioder for de forskellige brugertyper, datamigrering fra eksisterende systemer og implementeringsprocessen for det nye system
- fremdrift i proces med at afklare fremtidig udvikling og drift af funktionerne i kursusmodulet fra det nuværende evaluer.dk

Næste statusorientering udsendes primo maj 2022.


Lægelig Uddannelse

Skottenborg 26 - 8800 Viborg

Tlf.: 8728 5000 - Fax: 8728 5001

vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk

Tidsplan for 'Projekt nyt logbog.net - evaluer.dk' - marts 2022

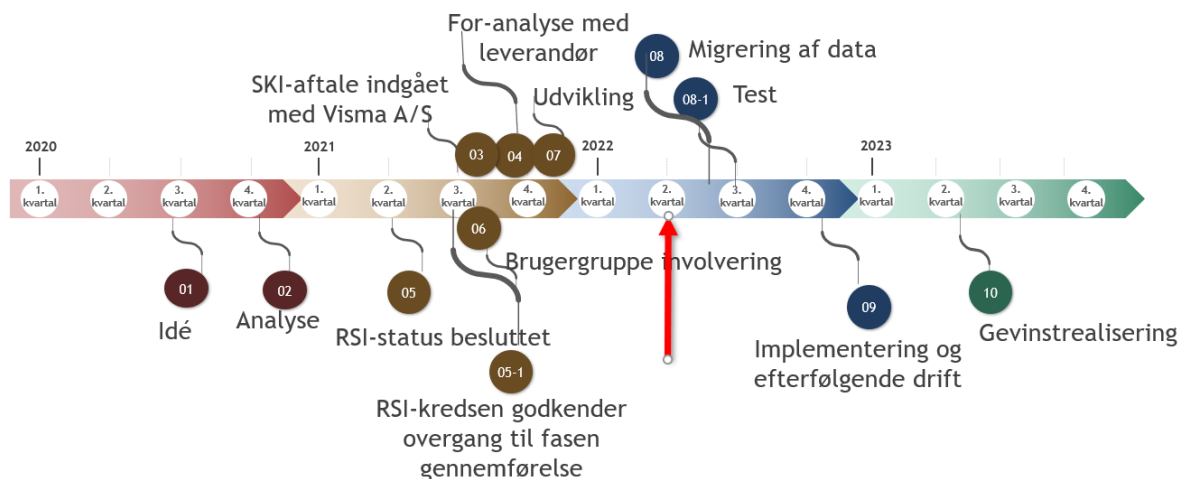


Opfølgning på sidste statusorientering

- Planlægningen af den resterende projektperiode præciseres, inklusive booking af brugergrupper mm. *(der er har været fokus på analyse af projektet og udfordringerne, hvorfor det har været nødvendigt at skubbe planlægningen af den resterende projektperiode)*
- Udvikling og planlægning af test for centrale funktioner og features (eksempelvis UAO, administratorfunktion mm.) *(der er har været fokus på udvikling af de centrale funktioner og features, der udestår mere indgående og sammenhængende test af de centrale funktioner og features)*
- Planlægning og strukturering af datamigrering *(der har været arbejdet med at få databehandlertaftale på plads og etableret testmiljø, hvor datamigreringen kan testes i, arbejdet er ikke afsluttet)*
- Planlægning af overgang fra nuværende it-system til nyt it-system *(Planlægning er igangsat men ikke færdiggjort)*

Baggrund og organisering

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariatene for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer www.logbog.net og www.evaluer.dk, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark. Projektet og tilhørende finansiering er godkendt af Sundhedsdirektørkredsen og projektet er knyttet til Regionernes Sundheds IT og følger dermed projektmodellen for regionale it-projekter.

Mens den nye it-løsning udvikles, fortsætter driften af logbog.net og evaluer.dk uforandret indtil ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning. Projekt 'Nyt logbog.net og evaluer.dk' arbejder på at udvikle én samlet it-løsning som erstatning for de 2 systemer i lægelig videreuddannelse og projektet håndteres ud fra nedenstående organisation.

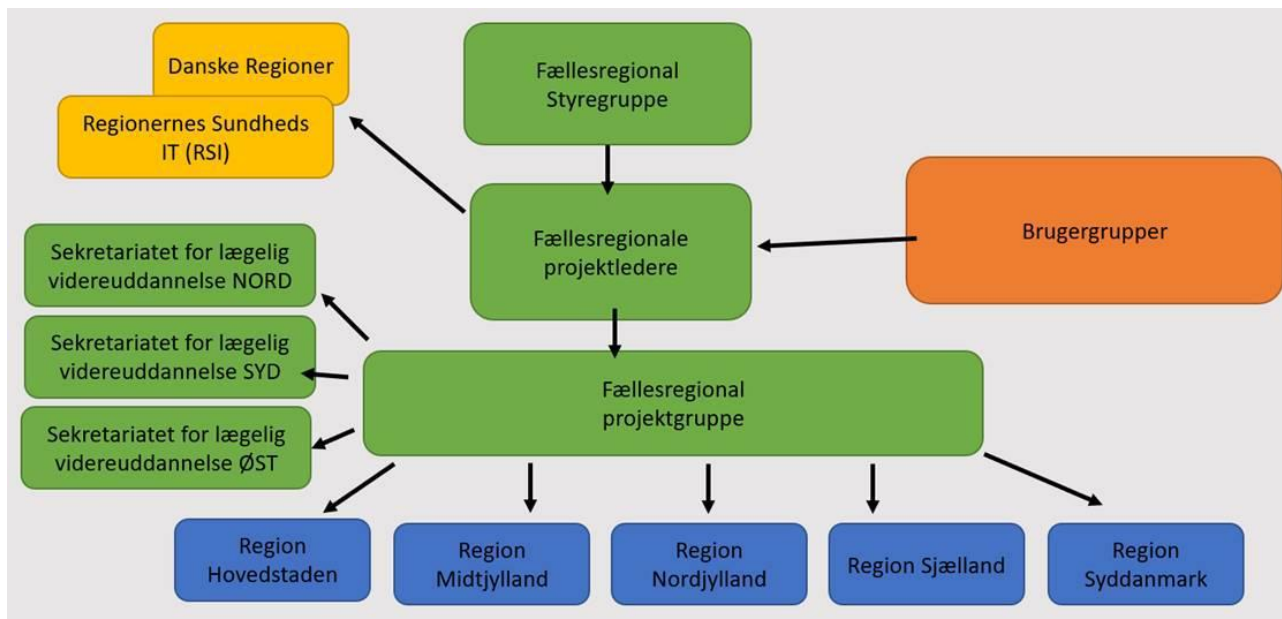

Tidligere

- Der er igangsat et projekt på tværs af landet efter Danske Regioners projektmodel, hvor Region Midtjylland har projektledelsen, men med bistand fra Region Hovedstaden. Projektet har status som et RSI-projekt, hvilket vil sige, at Regionernes Sundheds IT yder bistand til projektet.
- Per 31.10.2022 lukker evaluer.dk og logbog.net. Indtil da kører og serviceres systemerne som vanligt. De eksisterende data overføres til de nye systemer.
- Økonomien er blevet godkendt af Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds og finansieringen varetages af regionerne, og der er afsat ressourcer til videreudvikling af det nye system. Der er eksisterende krav til, hvad det nye system skal kunne.
- Der er udpeget brugergrupperepræsentanter fra regionerne og specialeselskaberne til at deltage i arbejdet
- Kontrakt er indgået med ny leverandør, som er Visma A/S
- Surveyxact-undersøgelse af de 2 nuværende systemer er afsluttet d. 31. august. Undersøgelsen er sendt til alle uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige og tutorlæger. Opsummering af svarene findes på:
<https://www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/logbognet-nyheder/projekt-'nyt-logbognet-og-evaluerdk'.aspx>
- Følgende aktiviteter med brugere er gennemført:
 - Workshop med national AMU-gruppe (14. september 2021)
 - Indsigtsworkshop med leverandør og brugere (17. september 2021)
 - I og H-gruppen – specialeselskabsrepræsentanter (21/9-21 og 9/2-22)
 - UKO-gruppen i VU-Nord (d.28. september 2021)
 - Kerne-gruppen – udpeget af Sekretariatene (4/10-21 og 27/1-22)
 - KBU-gruppen – udpeget af regionerne (6/10-21 og 31/1-22)
 - Almen medicin-gruppen – udpeget af DSAM (11/10-21 og 7/2-22)
- It-arkitektur er udarbejdet af leverandøren Visma A/S
- Designudkast til uddannelseslæger er blevet testet i november måned og korrigeret på baggrund af testsvar
- Designudkast til vejledere er blevet testet i januar måned og korrigeret på baggrund af testsvar

- Styregruppen har godkendt www.uddannelseslæge.dk som navnet for det nye system

Spørgsmål kan rettes til:

Projektleder Barbara Bøgsted Knudsen, bbk@regionh.dk telefon: 3866 9938, Region Hovedstaden

Projektleder Bertil Selde Krogh, berkro@rm.dk telefon: 3052 0517, Region Midtjylland
